10. Ajout voiles des fosses

La prévision de surcoût engendré par l'ajout de ces voiles de fosses s'élève à 3 339 791 Euros dans l'objectif de se conformer à une prescription de l'autorisation d'exploiter imprévisible au vu de la réglementation en vigueur.

Par rapport aux travaux de Génie Civil liés à l'ajout des voiles de fosses, nous avons identifié les travaux sur les plans de la zone HAL et nous avons aussi fait le métrage de m² de voile béton HAL (5 588 m²) (Voir croquis ci-dessous) :

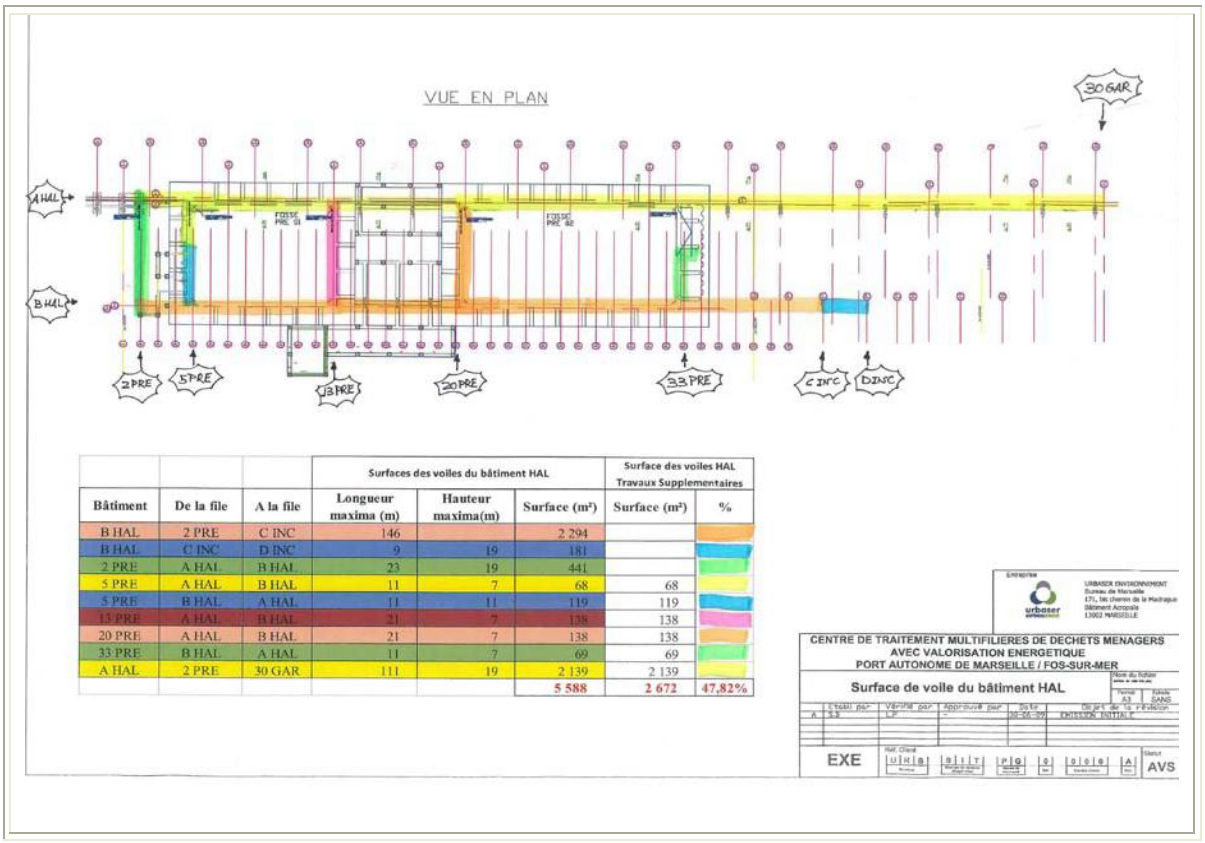

			Surfaces des voiles du bâtiment HAL			Surface des voiles HAL Travaux Supplementaires	
Bâtiment	De la file	A la file	Longueur maxima (m)	Hauteur maxima(m)	Surface (m²)	Surface (m²)	%
B HAL	2 PRE	C INC	146		2 294		
B HAL	C INC	D INC	9	19	181		
2 PRE	A HAL	B HAL	23	19	441		
5 PRE	A HAL	B HAL	11	7	68	68	
5 PRE	B HAL	A HAL	11	11	119	119	
13 PRE	A HAL	B HAL	21	7	138	138	
20 PRE	A HAL	B HAL	21	7	138	138	
33 PRE	B HAL	A HAL	11	7	69	69	
A HAL	2 PRE	30 GAR	111	19	2 139	2 139	
					5 588	2 672	47,82%
