CNIM
DIVISION
ENVIRONNEMENT

MARSEILLE - URBASER

USINE D'INCINERATION + VALORISATION
PROGRAMME GENERAL DE REALISATION
PROGRAMME PRELIMINAIRE

REFERENCE : 03721200 /63W101
Rev. B du 30/09/04

N°	DESCRIPDESCRIPTION ACTIVITIES
1	**DELAI GLOBAL REALISATION**
2	**TRANCHE FERME ETUDES**
12	OS TRANCHE FERME ETUDES
13	Période études tranche ferme
14	**Fourniture des éléments nécessaires pour rédaction dossier DAE**
15	**Réalisation du dossier de demande de Permis de Construire**
16	**Spec de consultation & etudes de détail**
17	**Anticipation passation cde etudes équipements principaux**
18	cde etudes équipement de chauffe
19	cde etudes Turbo alternateur
20	cde etudes Aerocondenseur
21	**Anticipation passation cde matière**
22	cde tubes écrans & collecteurs
23	cde plats ailettes chaudières
30	**TRANCHE CONDITIONNELLE**
60	OS TRANCHE CONDITIONNELLE TRAVAUX
61	**ETUDES**
62	Etudes générales
63	Etudes de Détails
64	**APPROVISIONNEMENT & FABRICATION**
65	Equipement de chauffe
66	Chaudière
67	Turbo alternateur
68	Aéro condenseur
69	**MONTAGE SITE EQUIPEMENTS**
70	Charpente & passerelles support chaudière
71	Chaudière & Equipement de chauffe
72	Epreuve hydraulique chaudière
73	Réacteurs
74	Filtres à manches
75	DeNOx SCR
76	Cheminée
77	Tuyauteries
78	Turbo alternateur
79	Aéro condenseur
80	Câblage Electricité & Contrôle Commande
81	Equipements divers
82	Periode Constat d'Achèvement des Travaux
83	**ESSAIS - MISE EN ROUTE & MARCHE INDUSTRIELLE**
84	Essais préliminaires à froid
85	Mise à disp.puissance electrique pour alimentation centre de tri & UVB
86	Essais à chaud & Mise au Point
87	1èr Allumage aux brûleurs
88	1èr Allumage aux OM
89	1ère vapeur à la turbine
90	Marche Industrielle
91	RECEPTION

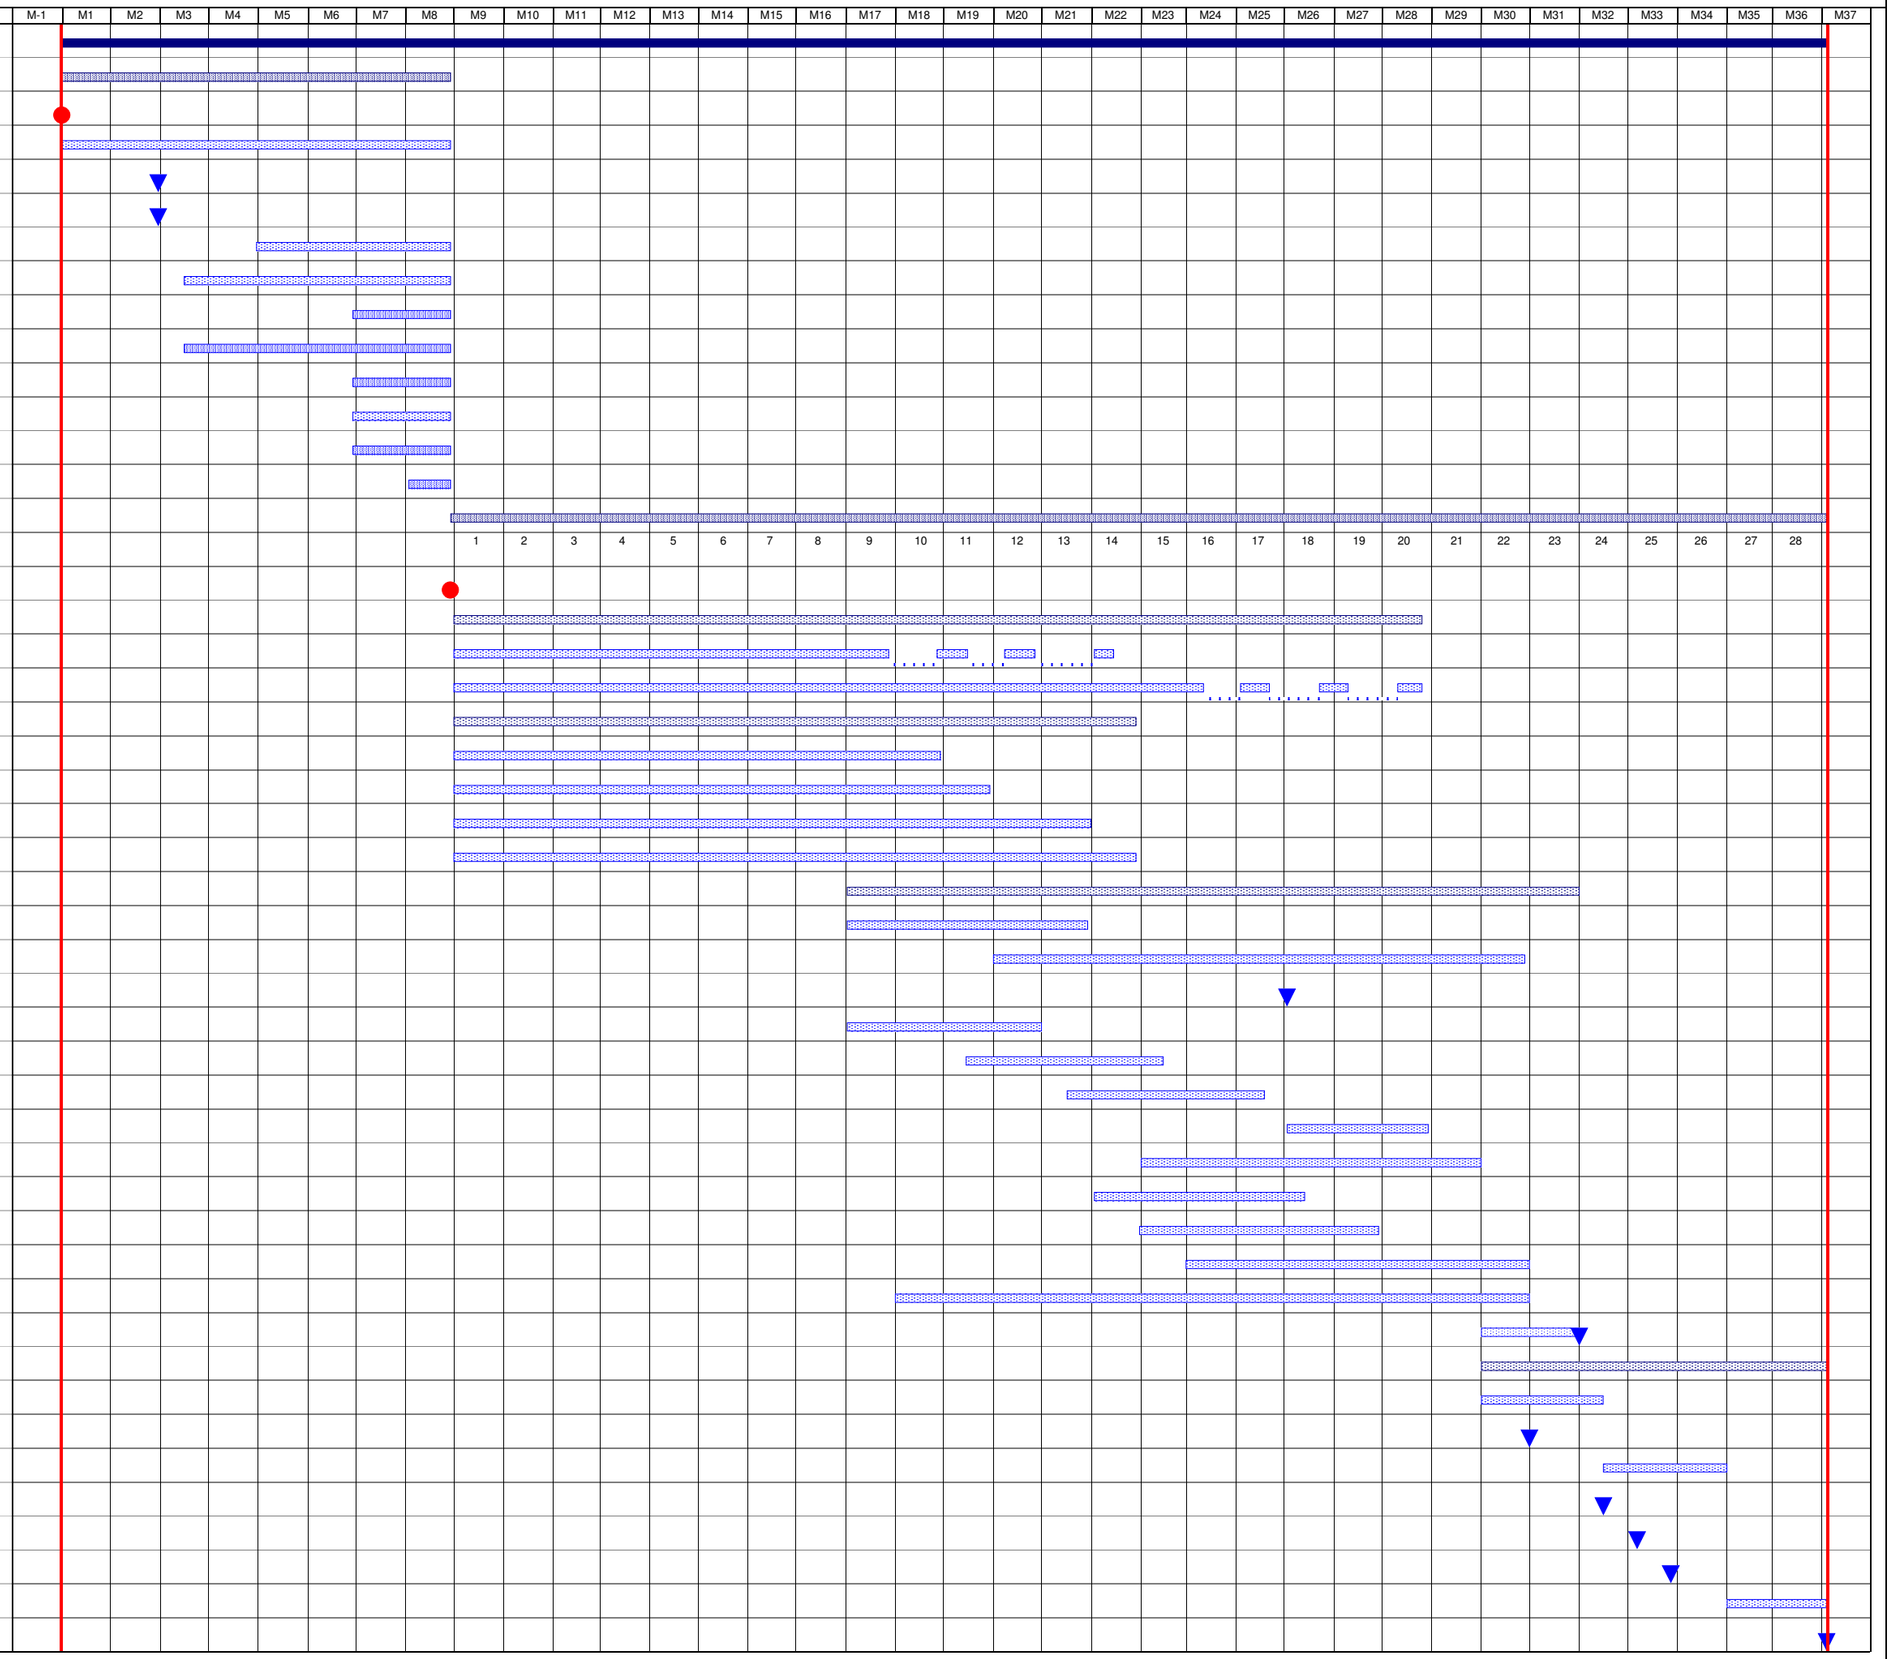

MARSEILLE - URBASER

USINE D'INCINERATION + VALORISATION
PROGRAMME GENERAL DE REALISATION

PROGRAMME PRELIMINAIRE
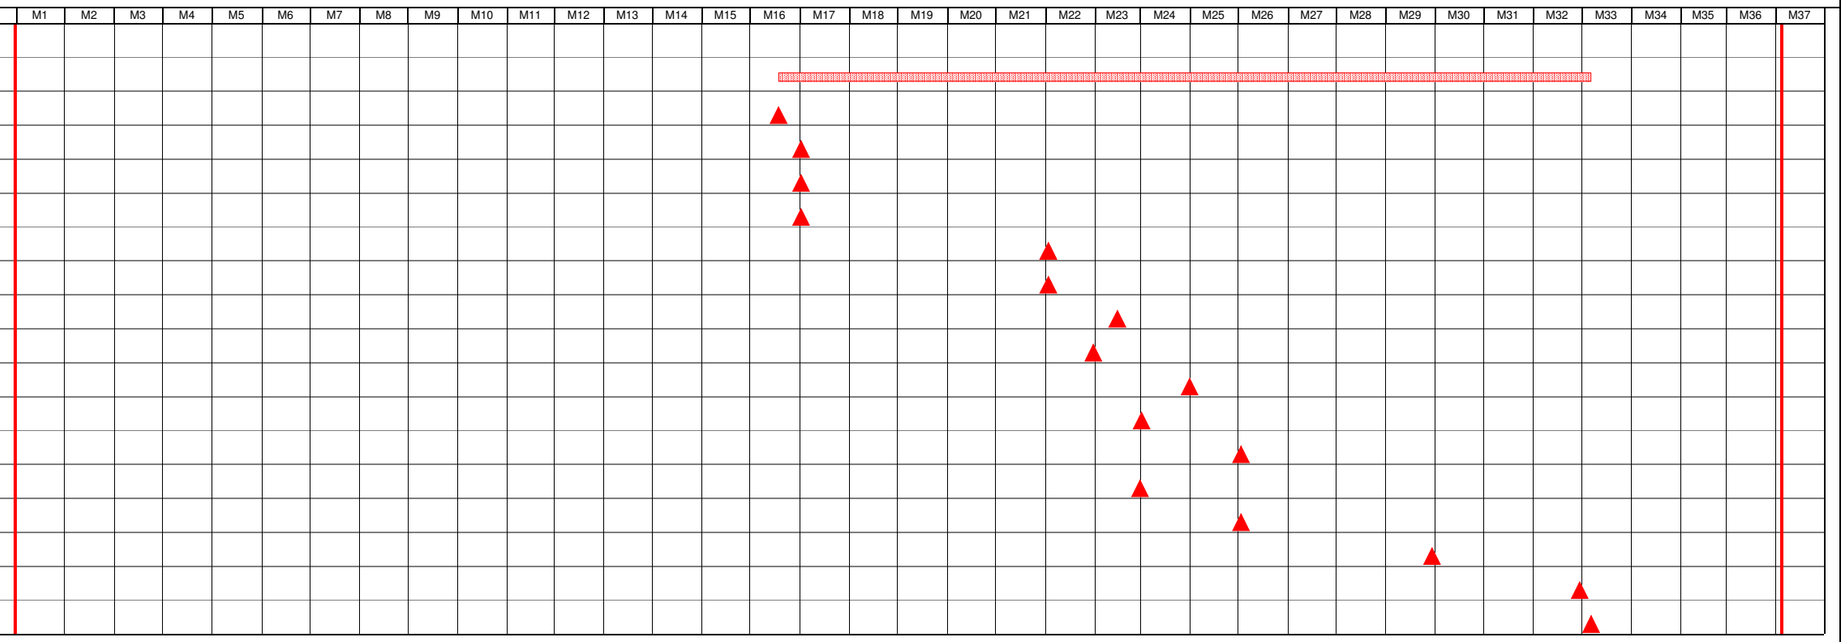
N°	DESCRIPDESCRIPTION ACTIVITIES
92	
93	**ACTIVITE CLIENT**
94	Màd routes accès-zones de stockages-zones implantation grues de levage
95	Fin génie civil plancher trémie + 20,50 & liberation zone hall chaudière
96	Mise à disp.GC zone chaudière niv.0,00 & plancher +6,5
97	Mise à disp.GC zone Traitement de fumées niv.0,00
98	Mise à disp.GC locaux techniques
99	Mise à disp.GC local turbo alternateur (avec reservation en toiture)
100	Fermeture reservation en toit du local turbo alternateur
101	Mise à disp.GC Zone aèroconcenseur
102	Début montage charpente bât.hall chaudières
103	Début montage charpente bât.hall trait.des fumées
104	Mise à disp.maintien cheminées en toiture
105	Mise à disp.locaux electriques (hors eau & hors air)
106	Mise à disp.salle de contrôle cde (hors eau & hors air et finitions)
107	Mise à disp.Puissance electrique
108	Mise à disp.OM & ponts roulants OM
109	Mise à disp.Evacuation mâchefers
