Nº	Nom de la tâche	Durée
1	**Etudes de détails**	**30 jours**
2	Plans Fondations	15 jours
3	Plans structure	15 jours
4	Remise DCE Terrassement	0 jour
5	Consultation et mise au point marché	30 jours
6	Mobilisation	20 jours
7	Démarrage des travaux	0 jour
8	Déviation provisoire	20 jours
9	**Ouvrage d'art**	**210 jours**
10	Fondations profondes	30 jours
11	Infrastructure	60 jours
12	**Pont 2 voies**	**120 jours**
13	Voiles et soutiens	60 jours
14	Tablier	60 jours
15	**Tunnel 1 voie**	**80 jours**
16	Voiles latéraux	40 jours
17	Tablier	40 jours
18	**Rampe d'accès**	**230 jours**
19	Renforcement de sol	30 jours
20	Terrassement 1er phase	60 jours
21	Terrassement 2nd phase	80 jours
22	**Voiries**	**45 jours**
23	corps de chaussée	20 jours
24	Enrobé	10 jours
25	Signalisation et sécurité	15 jours
26	Rétablissement accès	0 jour

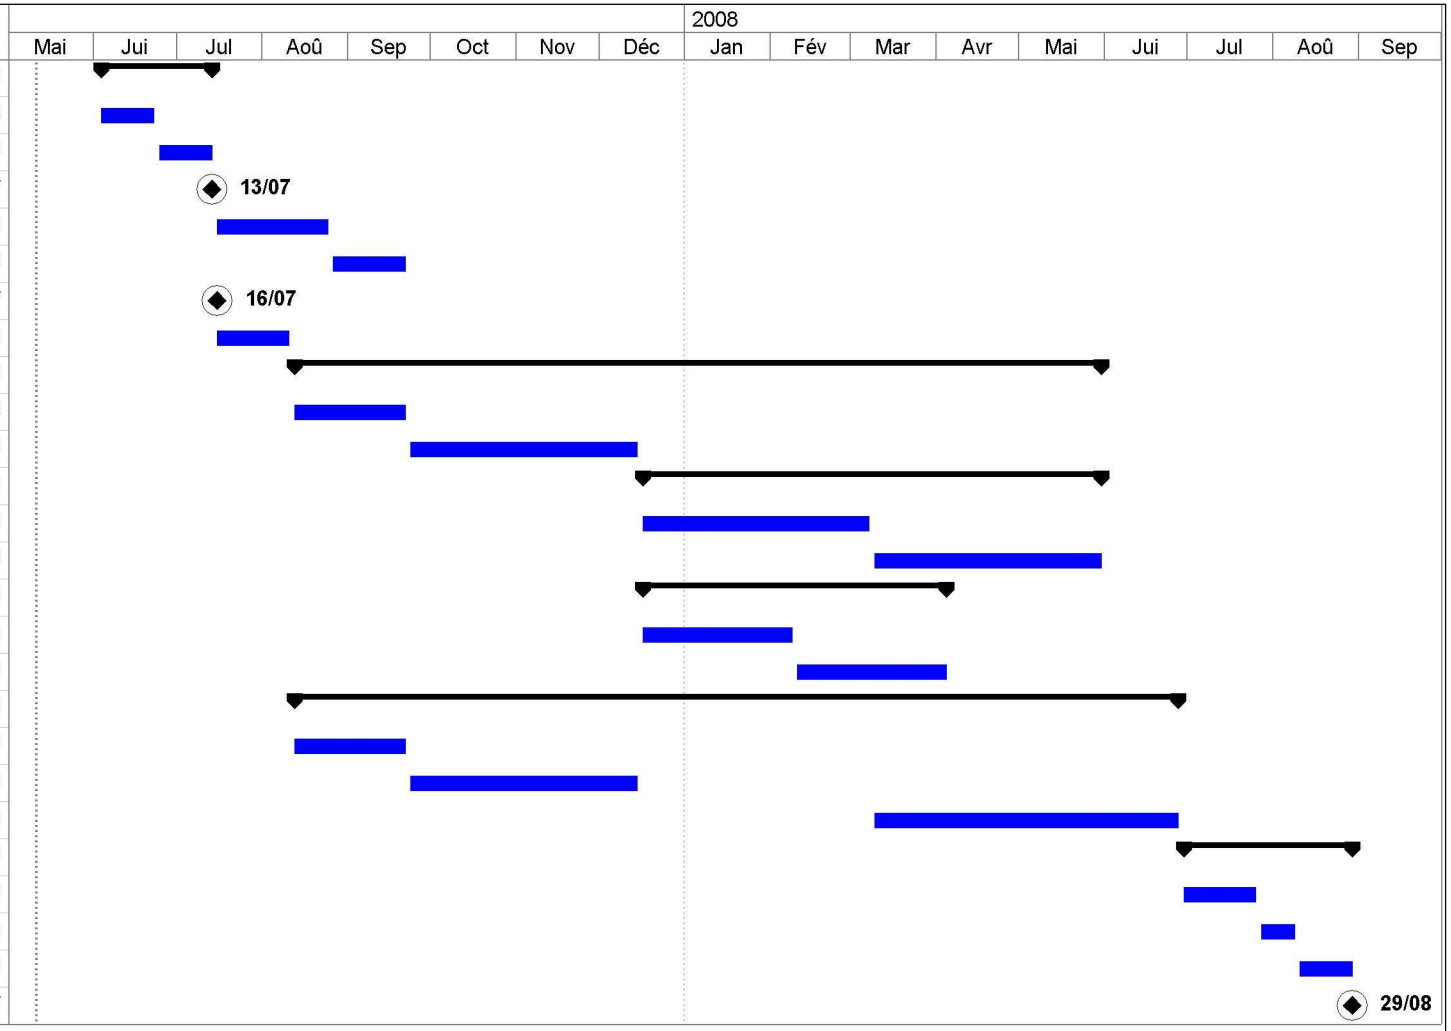

Projet : Ouvrage d'Art
Date : 11/05/2007

Tâche — Jalon — Récapitulative
